



MATRIZ DE INCIDENCIA



actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		3	3						
2			4	F=					
3				2	3				
4					3	4			
5						2	4		
6								4	
7								6	
8									4
9									



tarea	FTb	Fta	Tt	MFt	Tarea Cr.
1	2	3	0	3	si
2	3	7	0	3	no
3	7	3	4	0	si
4	9	3	0	6	no
5	9	7	2	0	si
6	15	9	3	3	no
7	13	9	4	0	si
8	15	7	3	1	no
9	19	14	4	1	no

Que nodos dibujo sobre la linea cronologica?

los 1 y 9 por ser iniciales y finales

los nodos iniciales de las demas tareas criticas halladas

en este caso serian el 1 (q se repite x ser inicial), 2,3,4, 7

o sea que sobre la linea cronologica tendria 6 tareas, la 1-2-2-3-4-4-7-9, las demas seran graficadas con flechas

No tiene sentido graficarlas con flechas a las tareas criticas ya que su MF=0, notar que la diferencia entre la linea punteada y la flecha es su MFt correspondiente

Ejercicio:


MOD = 5 6 x semana, se paga al finalizar la tarea
MP = 5 2 x semana, se paga al comenzar la tarea
la obra dura 19 semanas (fin matriz de incidencia)
interés = i = 0,01

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	suma
Ft	MP			8				4		8	4		8	12	8						84
	MOD		18				24		12	18		12	24	24	24	24		24		36	252
FT	MP	6		8	6			4	6	8		8	6	12			8				84
	MOD			18			24	18		12		18	24	12		18	24		24		252
VAN Ft:																					
VAN FT:																					

la tarea 1-2 tarda 3 semanas y no tiene margen por ser critica, como es MP se paga x adelantado, así q va al comienzo de la primer semana del Tt (semana 0)

la tarea 1-3 tarda 3 semanas y tiene un margen de 4 semanas, como estoy en Ft (lado azul), la flecha va al comienzo de la tarea, y como es MP se paga antes de la tarea, así q va al comienzo de la primer semana del Tt (semana 0)

como es MOD, se paga al finalizar la tarea, así q va al final de la ultima semana del Tt

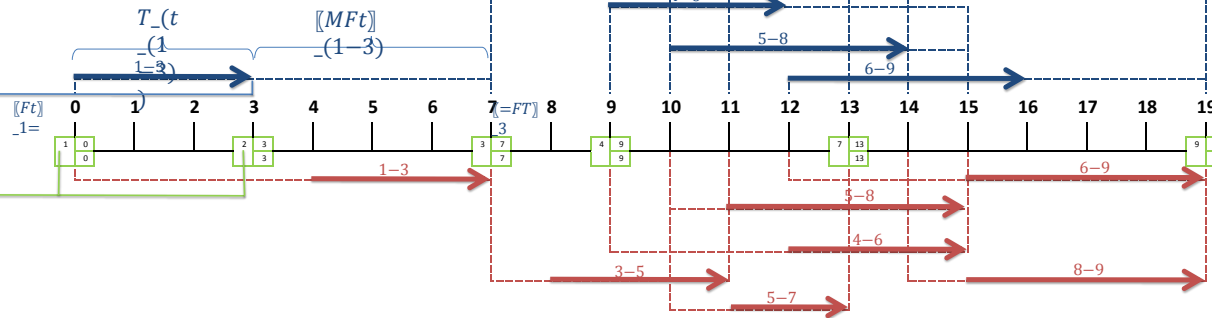

Ft

FT
