


ID	TAREA	DESCRIPCIÓN	PRECEDENTE	Tt
1	EST	Elegir estructura	2	5
2	CIN	Hacer cimientos		3
3	VITE	colocar vigas de techo	1	2
4	RETE	Revestir techo	3	3
5	ELEC	Cableado Eléctrico	1	4
6	EXT	Revoque Exteriores	7	4
7	VENT	Colocar Ventanas	1	2
8	PINT	Pintura Interior y Exterior	4; 6; 9	2
9	INT	Terminación detalles Interior	5;7	3

- Dibujar la red del proyecto siguiendo la notación
- Calcular la fecha temprana y tardía e indique el camino critico
- Construya el diagrama calendario para la fecha temprana y tardía con los costos diarios
- Comprima el proyecto a 14 días
- Calcule el costo total del proyecto para cada uno de los días que se comprime el proyecto y el costo total sin compresión.

ID TAREA	Costo Normal	Tiempo Tarea	Costo Acelerar
1 EST	20	5	50
2 CIM	16,66666667	3	0
3 VITE	40	2	0
4 RETE	26,66666667	3	5
5 ELEC	15	4	10
6 EXT	25	4	25
7 VENT	15	2	0
8 PINT	250	2	0
9 INT	60	3	60

Solución:

A. B.:

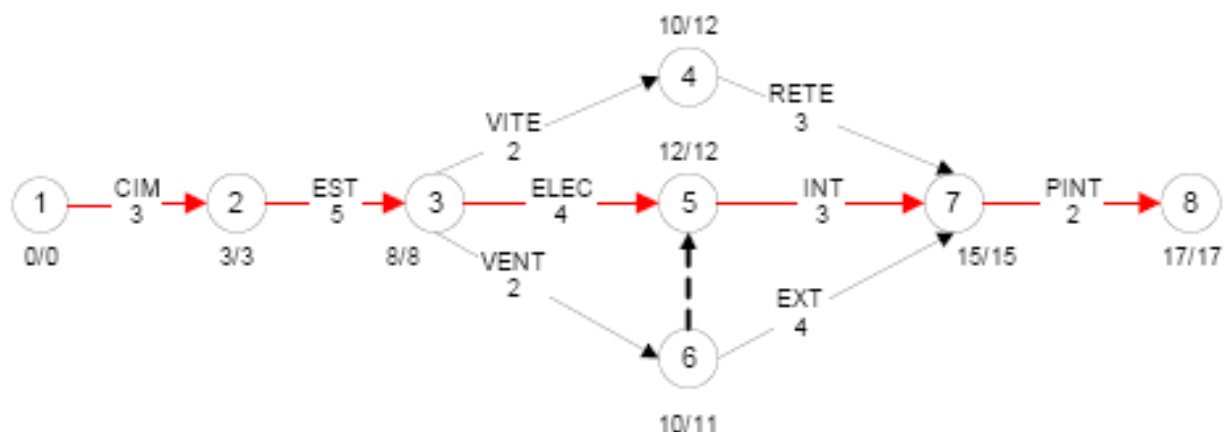

C. Diagrama Calendario Fecha Temprana



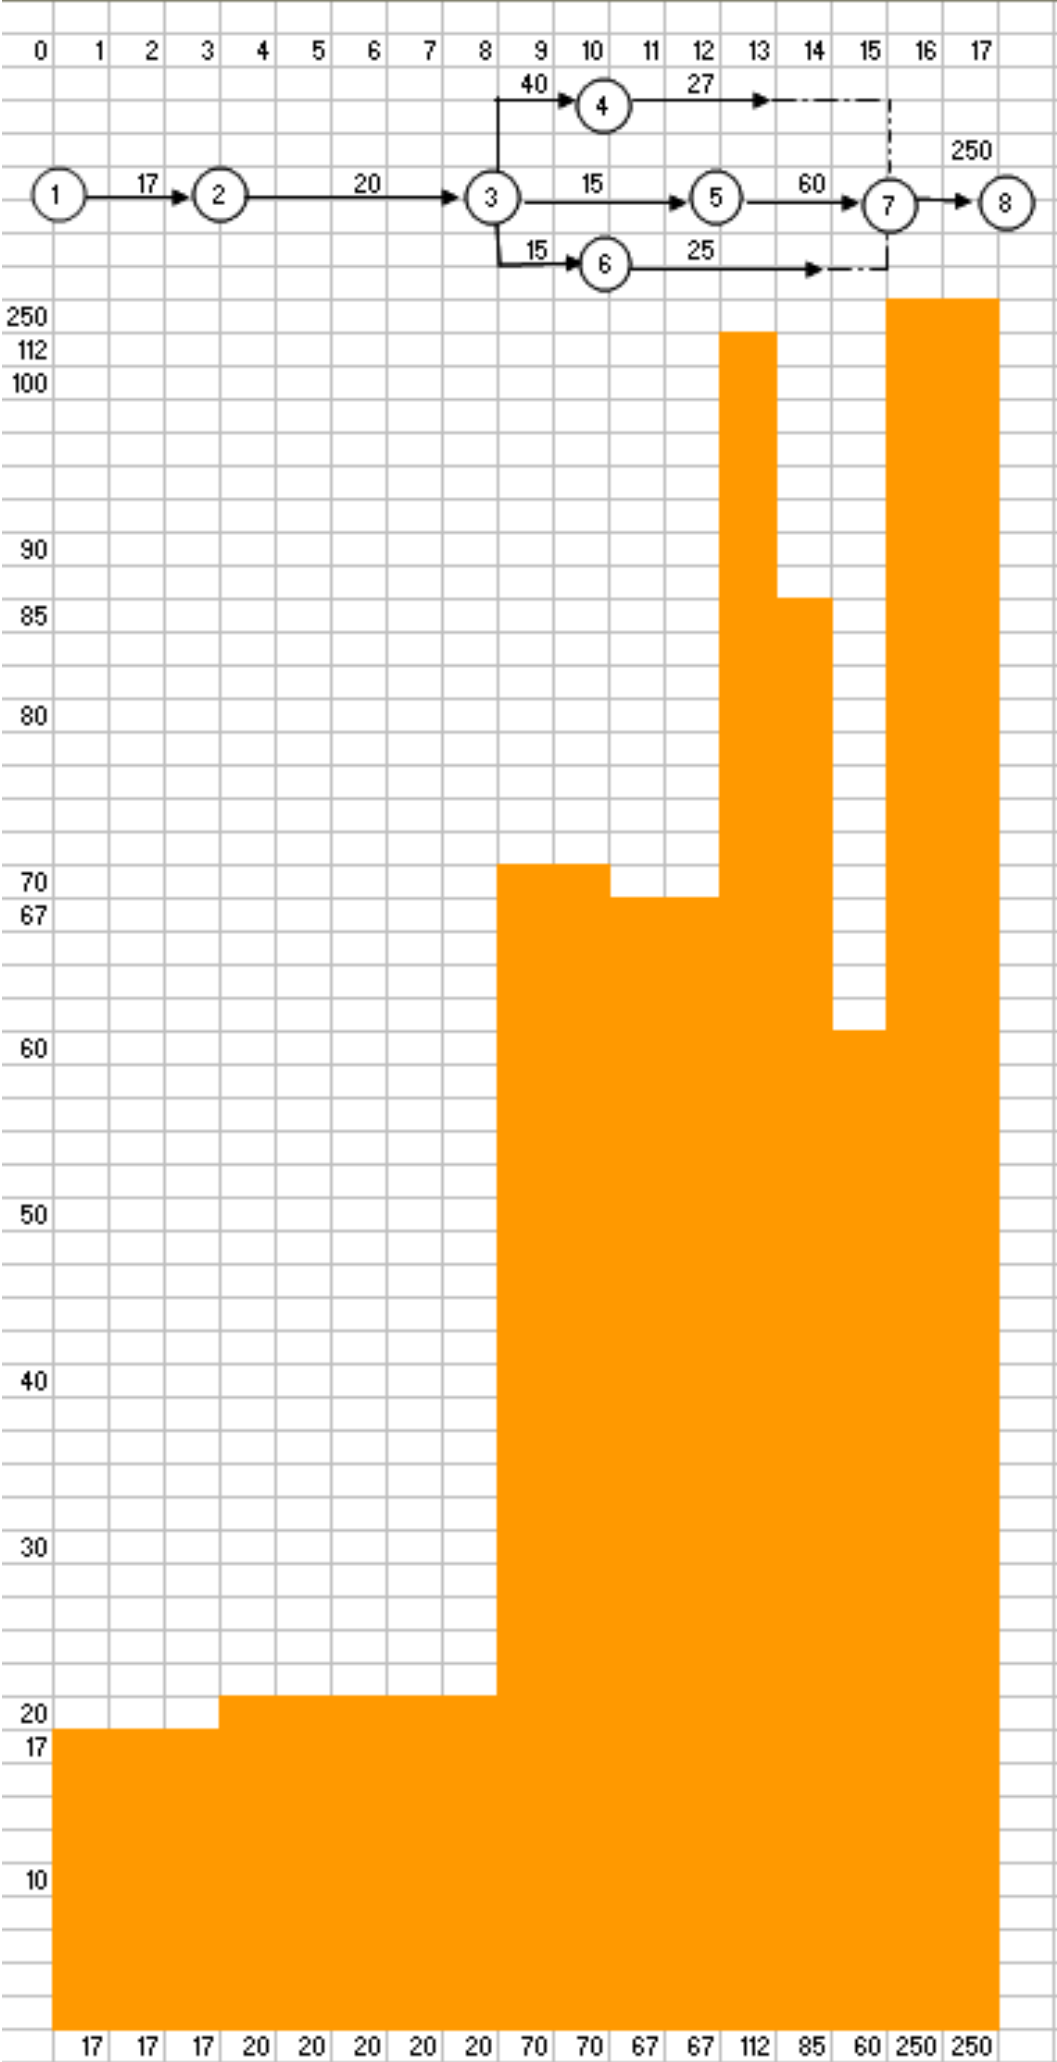


Diagrama Calendario Fecha Tardía

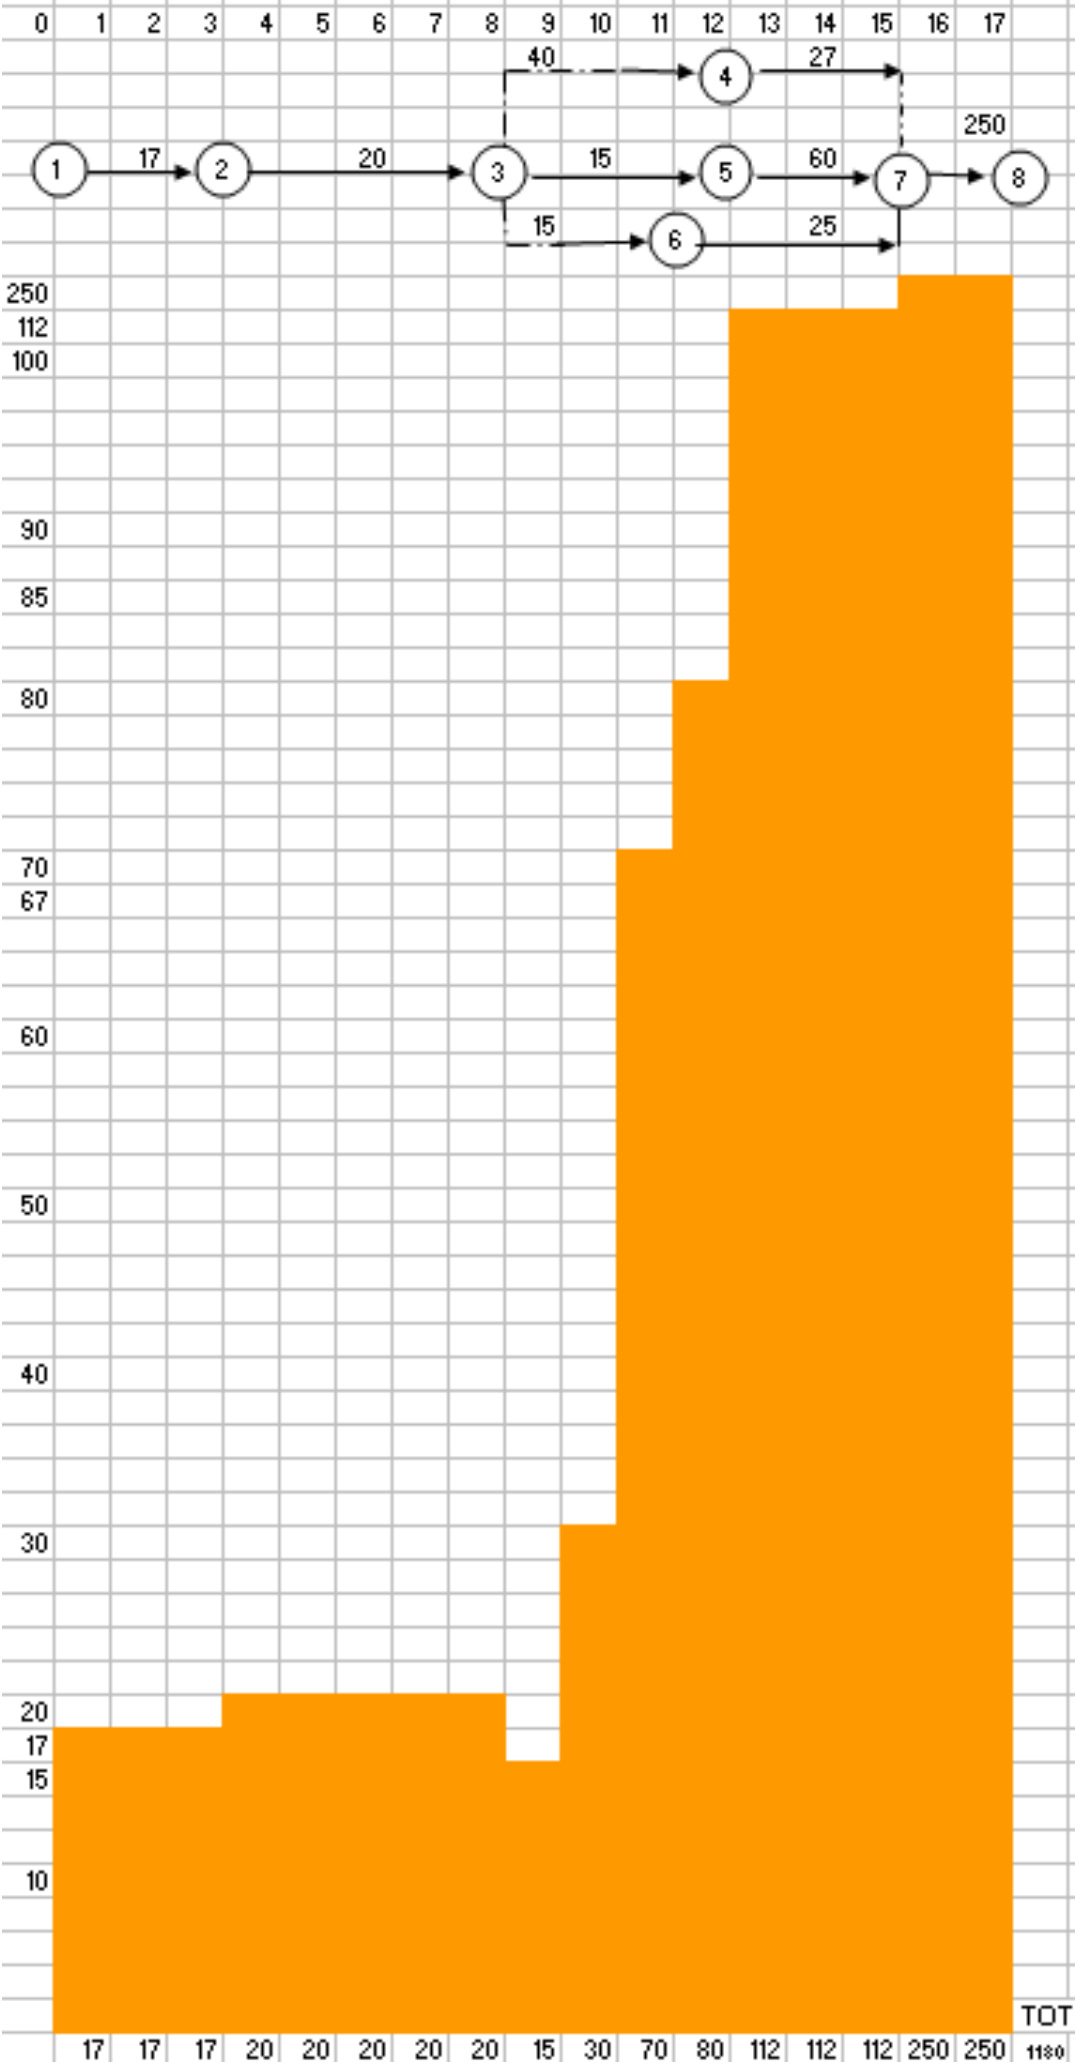

D.

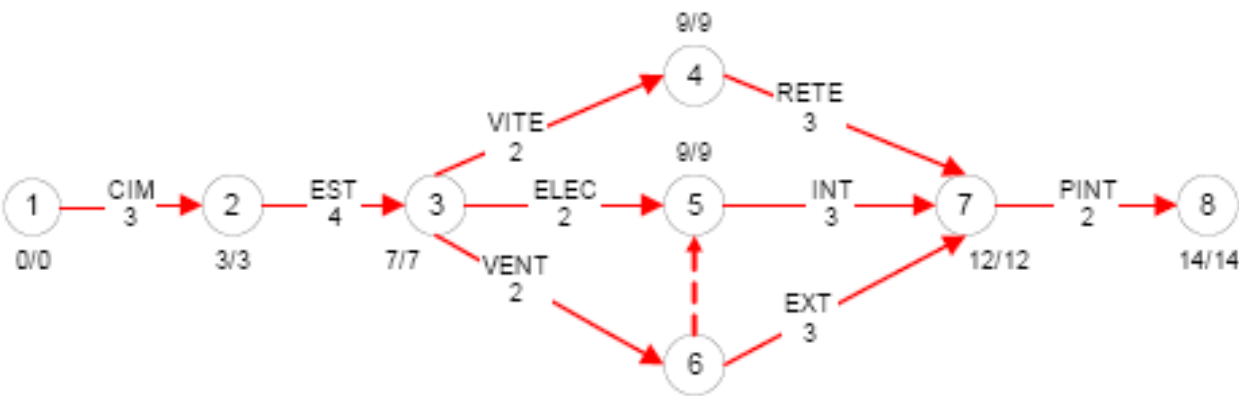

E.

Para acelerar el proyecto a 14 días se comprimieron:
ELEC-ELEC-EXT-EST= \$95 (10+10+25+50)

Duración	Costo	Adicional	Total	Inc
14	1180	95	1275	50
15	1180	45	1225	35
16	1180	10	1190	10
17	1180	0	1180	
